

= ACUSE =

Dependencia: Presidencia Municipal
Oficio No. MAP/SG/PG-1361/2024
Asunto: El que se indica


CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
ACATLÁN PUEBLA A 14 DE OCTUBRE DE 2024




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO
DR. PEDRO GARCÍA NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO



MUNICIPIO DE ACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE REGISTRARON PROYECTOS EN LA MIDS, LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	0.00	0	8	0.00	0	9	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON OTROS PROYECTOS.
	3er. Trimestre	4.76	1	21	2.78	1	36	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	2.78	1	36				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LAS OBRAS 24006, 24011, 24012, 24013 Y 24016, NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS. SE PRESENTARON PROBLEMAS EN LA PLATAFORMA PARA REGISTRAR LOS PROYECTOS.
	2do. Trimestre	62.50	5	8	55.56	5	9	META ALCANZADA.
	3er. Trimestre	38.10	8	21	63.89	23	36	LAS OBRAS 24006, 24048 Y 24049, NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS. META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	52.78	19	36				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LAS OBRAS 24010 Y 24018, NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS. SE PRESENTARON PROBLEMAS EN LA PLATAFORMA PARA REGISTRAR LOS PROYECTOS.
	2do. Trimestre	37.50	3	8	44.44	4	9	META ALCANZADA.
	3er. Trimestre	57.14	12	21	33.33	12	36	LA OBRA 24041, NO SE REPORTA EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS. META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	44.44	16	36				



000002



MUNICIPIO DE ACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	5676275.16	34057651.00	16.67	5676275.16	34057651.00	RECURSO TRANSFERIDO
	2do. Trimestre	41.67	14190687.90	34057651.00	50.00	17028825.48	34057651.00	RECURSO TRANSFERIDO
	3er. Trimestre	66.67	22705100.64	34057651.00	75.00	25543238.22	34057651.00	RECURSO TRANSFERIDO
	4to. Trimestre	100.00	34057651.00	34057651.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	13.73	4676583.86	34057651.00	13.73	4676583.86	34057651.00	META ALCANZADA
	2do. Trimestre	41.67	14190687.90	34057651.00	38.69	13177037.85	34057651.00	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR.
	3er. Trimestre	66.67	22705100.64	34057651.00	69.19	23564220.49	34057651.00	META ALCANZADA. EXISTEN PAGOS PENDIENTES DE FINIQUITAR.
	4to. Trimestre	100.00	34057651.00	34057651.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1.56	14190687.90	9078741.00	1.51	17028825.48	11255325.00	META ALCANZADA, LA RECAUDACIÓN FUE MAYOR.
	4to. Trimestre	2.46	34057651.00	13857147.00				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	1.87	76545741.00	75141959.04				
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	2do. Trimestre	64.84	9201583.00	14190687.90	56.58	9635316.71	17028825.48	META ALCANZADA
	4to. Trimestre	66.28	22571766.87	34057651.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al	2do. Trimestre	2.26	320587.00	14190687.90	0.14	24068.00	17028825.48	CONAGUA REALIZO UN AJUSTE EN EL MONTO A PAGAR.



000000



MUNICIPIO DE ACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FORTAMUN								
Concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	4to. Trimestre	1.88	641967.00	34057651.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.34	48741.00	14190687.90	1.39	237287.00	17028825.48	META ALCANZADA
	4to. Trimestre	0.29	97768.00	34057651.00				
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	14190687.90	0.00	0.00	17028825.48	NO SE ASIGNARON RECURSOS ESTE EJERCICIO.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	34057651.00				NO SE ASIGNARON RECURSOS ESTE EJERCICIO.
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	6.66	945541.00	14190687.90	5.87	1000665.23	17028825.48	META ALCANZADA
	4to. Trimestre		#¡REF!	34057651.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	25.89	3674235.90	14190687.90	13.38	2279700.91	17028825.48	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN INTEGRACIÓN PARA SU VALIDACIÓN.
	4to. Trimestre	25.76	8773596.13	34057651.00				



700000

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento o Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	3	1	2024	2	33	1	4	FAISMUN 3 TRIM *	1	20656.12	0												MODULO EN PROCESO, NO SE REPORTAN EN DESTINO LAS OBRAS 24006, 24041, 24048 Y 24049, ESTAN EN PROCESO DE REGISTRO EN LA MIDS. LOS INTERESES GENERADOS POR LA SPF SE REGISTRAN EN LA PARTIDA 614.
		2										1	332	1500000	1274963.19	1274963.19	1274963.19	1274963.19	1274963.19	1274963.19			PAGO POR LA ELABORACION DE PROYECTOS (GASTOS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SALUD Y DEPORTIVA EN DIFERENTES LOCALIDADES.
		2										2	612	19319242.8	12821533.5	12821533.5	12821533.5	12821533.5	12821533.5	12821533.5			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA AGUA, DRENAJE Y ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES LOCALIDADES.
		2										2	613	8958003.61	11525209.6	8828355.92	8828355.92	8828355.92	8828355.92	8828355.92			OBRAS DE URBANIZACIÓN PAVIMENTOS DE CALLES EN DIFERENTES LOCALIDADES. EN LA OBRA 24050 SE EJERCIERON LOS INTERESES.
		2										2	614	18659826.6	22125863.1	19429009.5	19429009.5	19429009.5	19429009.5	19429009.5			REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FOVISSTE (APORTACIÓN CON GOBIERNO DEL ESTADO)
		2										2	615	1000000	1210159.76	1210159.76	1210159.76	1210159.76	1210159.76	1210159.76			REHABILITACIÓN DE CAMINO
		2										2	622	4500000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000			
21	3	1	2024	2	33	1	5	FORTAMUN 3 TRIM *	1	11024.58	0												MODULO EN PROCESO. LOS INTERESES GENERADOS POR LA SPF SE REGISTRAN EN LA PARTIDA 614, EXISTEN PAGOS PENDIENTES DE FINQUITAR.
		2										1	113	5198596.13	5198596.13	4046495.84	4046495.84	4046495.84	3577664.24	3577664.24			PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2024 DE ACATLÁN PUEBLA
		2										1	271	450000	0	0	0	0	0	0			PARTIDA CANCELADA
		2										1	311	13000000	9285178.6	7207187.35	7207187.35	7207187.35	6341717	6341717			PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA A CFE
		2										1	313	739735	809629	562284	562284	562284	562284	562284			SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2024
		2										2	565	1501000	0	0	0	0	0	0			OBLIGACIONES FINANCIERAS: PAGOS DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS (CONAGUA) 2024
		2										2	581	500000	521000	521000	521000	521000	521000	521000			PARTIDA CANCELADA
		2										2	614	522553	2887459.4	1343280.68	1343280.68	1343280.68	1343280.68	1343280.68			ADQUISICION DE TERRENO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA, MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA
		2										2	622	2574000	589932.78	589932.78	589932.78	589932.78	589932.78	589932.78			OBRAS DE URBANIZACIÓN PAVIMENTOS DE CALLES EN DIFERENTES LOCALIDADES. EN LA OBRA 24050 SE EJERCIERON LOS INTERESES.
		2										1	853	9571766.87	9571766.87	8260286.15	8260286.15	8260286.15	7604545.79	7604545.79			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD PUBLICA 2024 Y EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO.
		2										2	523	0	1501000	0	0	0	0	0			APORTACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 2024 Y CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ACATLÁN 2024.
		2										2	541	0	680316.8	0	0	0	0	0			FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN, DEL EJERCICIO FISCAL 2024
		2										2	612	0	2416828.32	2416828.32	2416828.32	2416828.32	2416828.32	2416828.32			ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2024
		2										2	271	0	606967.68	606967.68	606967.68	606967.68	606967.68	606967.68			REHABILITACION DEL PARQUE DE SAN LUIS
		2																					EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 2024



000005



MUNICIPIO DE ACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2024
DESTINO DE GASTO
FAISMUN




14 OCT 2024

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	132910	24006	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, ESTADO DE PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 450,490.71	\$ 450,490.71	\$ 450,490.71	\$ 450,490.71	\$ 450,490.71	\$ 450,490.71	\$ 450,490.71	100	100	619.85	metros lineales	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, EN PROCESO DE VALIDACIÓN EN LA MIDS, YA QUE SE ELIJERON POR OBSERVACIONES DE BIENESTAR FEDERAL. FOLIO MIDS 339536
PUE240302436848	323655	24007	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS) 2024	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 1,200,000.00	\$ 1,274,963.19	\$ 1,274,963.19	\$ 1,274,963.19	\$ 1,274,963.19	\$ 1,274,963.19	\$ 1,274,963.19	100	100	24	PROYECTO	SERVICIO TERMINADO AL 100%
PUE240302411502	100158	24008	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GENERAL JOAQUÍN OSORIO ENTRE LAS CALLES JUAN ALVAREZ Y LAS PEÑITAS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	LA PALMA	\$ 1,139,589.13	\$ 1,137,013.92	\$ 1,137,013.92	\$ 1,137,013.92	\$ 1,137,013.92	\$ 1,137,013.92	\$ 1,137,013.92	100	100	206.33	metros lineales	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240302421819	243383	24009	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GENERAL JOAQUÍN OSORIO ENTRE LAS CALLES JUAN ALVAREZ Y LAS PEÑITAS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	LA PALMA	\$ 3,024,649.96	\$ 3,021,782.61	\$ 3,021,782.61	\$ 3,021,782.61	\$ 3,021,782.61	\$ 3,021,782.61	\$ 3,021,782.61	100	100	2,031.88	Metros cuadrados	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240202386819	133911	24010	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	SAN CRISTOBAL	\$ 1,310,272.14	\$ 1,308,638.53	\$ 1,308,638.53	\$ 1,308,638.53	\$ 1,308,638.53	\$ 1,308,638.53	\$ 1,308,638.53	100	100	642.07	Metros cuadrados	REPORTADA EN EL 2DO. TRIMESTRE. OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240202374541	91998	24011	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C, EN LA ESCUELA PRIMARIA BRAULIO RODRIGUEZ CCT 21DPR09018, EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	TRES CRUCES	\$ 774,651.51	\$ 771,465.44	\$ 771,465.44	\$ 771,465.44	\$ 771,465.44	\$ 771,465.44	\$ 771,465.44	100	100	140.78	Metros cuadrados	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240202374794	92873	24012	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DE LA LIBERTAD ENTRE PERIFÉRICO A ICACQUXTLA Y CALLE XICOTENCATL; CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE DE LA LIBERTAD Y BARRANCA TEMAZCAL EN BARRIO DE SAN MIGUEL EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 2,709,980.91	\$ 2,707,652.86	\$ 2,707,652.86	\$ 2,707,652.86	\$ 2,707,652.86	\$ 2,707,652.86	\$ 2,707,652.86	100	100	547.04 m	metros lineales	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240202374819	92946	24013	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BARRANCA CHINACA Y CALLE TENOCHTITLÁN EN EL BARRIO DE SAN GABRIEL EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA.	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 632,029.20	\$ 630,068.28	\$ 630,068.28	\$ 630,068.28	\$ 630,068.28	\$ 630,068.28	\$ 630,068.28	100	100	192.43	metros lineales	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240302430830	295454	24014	REHABILITACION EN EL PREESCOLAR " ROSAURA ZAPATA " C.C.T. 21DJN00297 EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 605,957.84	\$ 604,492.27	\$ 604,492.27	\$ 604,492.27	\$ 604,492.27	\$ 604,492.27	\$ 604,492.27	100	100	9	AULAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA 9 AULAS Y 1 MOD. SANITARIO.
PUE240302427885	282453	24015	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE C.C.T. 21DPR3546J, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	BARRIO DE GUADALUPE	\$ 1,128,797.97	\$ 1,125,919.28	\$ 1,125,919.28	\$ 1,125,919.28	\$ 1,125,919.28	\$ 1,125,919.28	\$ 1,125,919.28	100	100	340.69	Metros cuadrados	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240202379756	107852	24016	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR LIC. BENITO JUAREZ CLAVE C.C.T. 21EES0016C EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 2,842,686.29	\$ 2,840,736.30	\$ 2,840,736.30	\$ 2,840,736.30	\$ 2,840,736.30	\$ 2,840,736.30	\$ 2,840,736.30	100	100	648.06	Metros cuadrados	REPORTADA EN EL 2DO. TRIMESTRE. OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240302411547	100354	24017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE CENTRAL MARIANO GONZALEZ 04000 AL 04194.89 ENTRE CARRETERA COYOTEPEC-ACATLÁN Y BARRANCA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TETELCINGO, MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	TETELCINGO	\$ 1,971,123.24	\$ 1,968,957.48	\$ 1,968,957.48	\$ 1,968,957.48	\$ 1,968,957.48	\$ 1,968,957.48	\$ 1,968,957.48	100	100	1,326.09	Metros cuadrados	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240202374827	92974	24018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CADEANAMIENTO 000 AL 160 EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA CHICA, MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA - 92974	LA NORIA CHICA	\$ 1,759,826.58	\$ 1,759,826.58	\$ 1,759,826.58	\$ 1,759,826.58	\$ 1,759,826.58	\$ 1,759,826.58	\$ 1,759,826.58	100	100	1,337.54	Metros cuadrados	REPORTADA EN EL 2DO. TRIMESTRE. OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240202386771	133616	24019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CADEANAMIENTO 000 AL 0160, EN LA LOCALIDAD DE POZO EL HUZACHE MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA - 133616	POZO EL HUZACHE	\$ 1,180,264.62	\$ 1,177,938.76	\$ 1,177,938.76	\$ 1,177,938.76	\$ 1,177,938.76	\$ 1,177,938.76	\$ 1,177,938.76	100	100	1,058.83	Metros cuadrados	REPORTADA EN EL 2DO. TRIMESTRE. OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240302411551	180368	24020	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FOVISSSTE EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100	40	5,688.00	Metros cuadrados	EN PROCESO, EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ SU APORTACIÓN AL 100% CON LAS SIGUIENTES FUENTES FAISMUN \$ 5,000,000.00 Y RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR \$
PUE240202386725	133334	24022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE CALLE MORELOS ENTRE BARRANCA CHINACA Y PERIFERICO ICACQUXTLA, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CARLOS MARX EN EL BARRIO DE SAN GABRIEL EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 2,100,687.67	\$ 2,098,319.10	\$ 2,098,319.10	\$ 2,098,319.10	\$ 2,098,319.10	\$ 2,098,319.10	\$ 2,098,319.10	100	100	1451.79	Metros cuadrados	REPORTADA EN EL 2DO. TRIMESTRE. OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240302411565	180416	24023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS ENTRE CALLE DE LA LIBERTAD Y CALLE TENOCHTITLÁN EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 2,374,749.81	\$ 2,372,438.35	\$ 2,372,438.35	\$ 2,372,438.35	\$ 2,372,438.35	\$ 2,372,438.35	\$ 2,372,438.35	100	100	1,253.83	Metros cuadrados	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.

000000

PUE240302437013	324393	24024	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DEL ILAMACRIGO, BARRIO DE SANTIAGO ILAMACRIGO, SANTA ANA TEMPEXQUILTE(LOS MARQUEZ), SAN BERNARDO, RANCHO DE LIMA(LA MATAIZA), HERMEGILDO GALEANA Y SAN FRANCISCO RANCHO NUEVO , PERTENECENTES AL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 1,210,964.11	\$ 1,210,159.76	\$ 1,210,159.76	\$ 1,210,159.76	\$ 1,210,159.76	\$ 1,210,159.76	\$ 1,210,159.76	100	100	11,760.00	metros cúbicos	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240302411569	180422	24025	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 NORTE EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE AZUETA, MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	AMATITLÁN	\$ 1,429,406.20	\$ 1,668,483.92	\$ 1,668,483.92	\$ 1,668,483.92	\$ 1,668,483.92	\$ 1,668,483.92	\$ 1,668,483.92	100	100	261.49	metros lineales	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240302411677	180438	24027	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO TIPO I EN EL PREESCOLAR "ESTEFANA CASTAÑEDA" C.C.T. 21DJN263Q EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 535,938.70	\$ 533,855.91	\$ 533,855.91	\$ 533,855.91	\$ 533,855.91	\$ 533,855.91	\$ 533,855.91	100	100	23.31	Metros cuadrados de construcción	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240302432601	303542	24028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOPRETO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE JOSE G. HERRERA Y LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE GARZONES(SANTA GERTRUDIS), MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	GARZONES (SANTA GERTRUDIS)	\$ 1,212,329.18	\$ 1,209,967.55	\$ 1,209,967.55	\$ 1,209,967.55	\$ 1,209,967.55	\$ 1,209,967.55	\$ 1,209,967.55	100	100	729.88	Metros cuadrados	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240302427898	282483	24030	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CRUZ RIVERA CLAVE 21DPR22890 EN LA LOCALIDAD DE TIANGUSTENGO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	TIANGUSTENGO	\$ 1,673,895.50	\$ 1,671,361.87	\$ 1,671,361.87	\$ 1,671,361.87	\$ 1,671,361.87	\$ 1,671,361.87	\$ 1,671,361.87	100	100	534.04 M2	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240302430731	295188	24031	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE AZUCENAS ENTRE CALLE RIO TEAC Y CERRO EL TECOLOTE DE LA COLONIA FOSSISSE EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 119,306.63	\$ 119,306.63	\$ 119,306.63	\$ 119,306.63	\$ 119,306.63	\$ 119,306.63	\$ 119,306.63	100	100	6	poste	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240302430762	295297	24032	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DALIA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA FOSSISSE EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 75,792.57	\$ 75,792.57	\$ 75,792.57	\$ 75,792.57	\$ 75,792.57	\$ 75,792.57	\$ 75,792.57	100	100	3	poste	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240302430805	295392	24033	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO LA HUERTA - XAVACATLÁN ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD LA HUERTA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	LA HUERTA	\$ 107,374.10	\$ 107,374.10	\$ 107,374.10	\$ 107,374.10	\$ 107,374.10	\$ 107,374.10	\$ 107,374.10	100	0	5	poste	OBRA EJECUTADA POR CFE, YA REALIZO EL AYUNTAMIENTO EL PAGO AL 100%. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA POSTE.
PUE240302430814	295412	24034	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EUFEMIO ZAPATA ENTRE CALLE FROYLAN VELEZ Y CALLE IGNACIO DE LA TORRE EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 61,345.13	\$ 61,345.13	\$ 61,345.13	\$ 61,345.13	\$ 61,345.13	\$ 61,345.13	\$ 61,345.13	100	0	4	poste	OBRA EJECUTADA POR CFE, YA REALIZO EL AYUNTAMIENTO EL PAGO AL 100%. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA POSTE.
PUE240302430824	295435	24035	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE COLONIA ALLENDE Y PANTEON EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ALLENDE, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	COLONIA ALLENDE	\$ 205,965.45	\$ 205,965.45	\$ 205,965.45	\$ 205,965.45	\$ 205,965.45	\$ 205,965.45	\$ 205,965.45	100	50	14	poste	OBRA EJECUTADA POR CFE, YA REALIZO EL AYUNTAMIENTO EL PAGO AL 100%. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA POSTE.
PUE240302430819	295424	24036	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE FROYLAN VELEZ ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE AZTECA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 264,320.30	\$ 264,320.30	\$ 264,320.30	\$ 264,320.30	\$ 264,320.30	\$ 264,320.30	\$ 264,320.30	100	70	15	poste	OBRA EJECUTADA POR CFE, YA REALIZO EL AYUNTAMIENTO EL PAGO AL 100%. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA POSTE.
PUE240302423747	258876	24039	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	PIEDRA BLANCA	\$ 1,048,686.71	\$ 1,045,991.93	\$ 1,045,991.93	\$ 1,045,991.93	\$ 1,045,991.93	\$ 1,045,991.93	\$ 1,045,991.93	100	100	1,531.84	MTS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240302436865	323748	24040	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR DE CENTRO C.C.T. 21EJN072Q EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 670,268.90	\$ 668,194.38	\$ 668,194.38	\$ 668,194.38	\$ 668,194.38	\$ 668,194.38	\$ 668,194.38	100	100	137	m2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
		24041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOPRETO DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+150 EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	LA HUERTA	\$ 1,545,899.97	\$ 1,545,899.97	\$ 1,545,899.97	\$ 1,545,899.97	\$ 1,545,899.97	\$ 1,545,899.97	\$ 1,545,899.97	100	100	900	M2	OBRA EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA MIDS CON FOLIO No. 339602.OBRA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAISMUN \$ 1,545,899.97 FORTAMUN \$ 392,335.18 IMPORTE TOTAL DE LA OBRA \$ 1,938,235.15
PUE240302423761	258902	24042	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T.21EPR008A EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, PRIMERA SECCION, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	SAN CRISTOBAL	\$ 1,749,843.37	\$ 1,747,449.91	\$ 1,747,449.91	\$ 1,747,449.91	\$ 1,747,449.91	\$ 1,747,449.91	\$ 1,747,449.91	100	100	534	m2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240302432657	303755	24043	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESCOPIDARIA SAN JUAN RIES DE LA CRUZ C.C.T. 21DYO219E EN LA PRIMERA SECCION DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	SAN CRISTOBAL	\$ 1,050,725.33	\$ 1,058,425.71	\$ 1,058,425.71	\$ 1,058,425.71	\$ 1,058,425.71	\$ 1,058,425.71	\$ 1,058,425.71	100	100	352	m2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240302436919	324060	24044	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR NICOLAS BRAVO C.C.T. 21DJN232P EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	TRES CRUCES	\$ 493,550.54	\$ 490,993.88	\$ 490,993.88	\$ 490,993.88	\$ 490,993.88	\$ 490,993.88	\$ 490,993.88	100	100	119	m2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240302432545	303334	24045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOPRETO DE CALLE MONTERREY ENTRE CALLE VERGARIUS Y CALLE ZACATECAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+200 EN LA SEGUNDA SECCION DE LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	TRES CRUCES	\$ 2,104,778.65	\$ 2,102,337.82	\$ 2,102,337.82	\$ 2,102,337.82	\$ 2,102,337.82	\$ 2,102,337.82	\$ 2,102,337.82	100	100	119	m2	OBRA EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA MIDS CON FOLIO No. 339602.OBRA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAISMUN \$ 1,545,899.97 FORTAMUN \$ 392,335.18 IMPORTE TOTAL DE LA OBRA \$ 1,938,235.15
PUE240302432707	304196	24046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOPRETO EN LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 NORTE EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE AZUETA, MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	AMATITLÁN DE AZUETA	\$ 1,306,602.27	\$ 1,306,602.27	\$ 1,306,602.27	\$ 1,306,602.27	\$ 1,306,602.27	\$ 1,306,602.27	\$ 1,306,602.27	100	100	890.18	m2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240302430847	295483	24047	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOPRETO DE LA PRIVADA DANIEL CORRO ARENAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	TRES CRUCES	\$ 881,096.85	\$ 864,938.98	\$ 864,938.98	\$ 864,938.98	\$ 864,938.98	\$ 864,938.98	\$ 864,938.98	100	100	456.23	m2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.

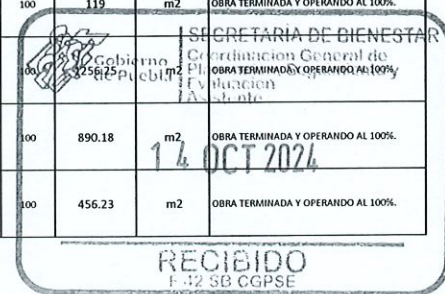

		24048	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CIRCUITO GUADALUPANO ENTRE CAMINO A LA NORIA Y CAJICHA EN LA LOCALIDAD DE LA SANDIA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	LA SANDIA	\$ 161,393.31	\$ 161,393.31	\$ 161,393.31	\$ 161,393.31	\$ 161,393.31	\$ 161,393.31	\$ 161,393.31	\$ 161,393.31	100	50	9	poste	OBRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA MIDS CON NO. DE FOLIO 339750. OBRA EJECUTADA POR CFE, YA REALIZO EL AYTO EL PAGO AL 100%. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA POSTE.
		24049	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE CENTRAL HIDALGO Y BARRANCA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LA HUERTA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	LA HUERTA	\$ 172,500.69	\$ 172,500.69	\$ 172,500.69	\$ 172,500.69	\$ 172,500.69	\$ 172,500.69	\$ 172,500.69	\$ 172,500.69	100	50	9	poste	OBRA EN PROCESO DE REVISIÓN MIDS FOLIO No. 339798. OBRA EJECUTADA POR CFE, YA REALIZO EL AYTO EL PAGO AL 100%. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA POSTE.
PUE240302439892		24050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE PRIVADA VERACRUZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+112 EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	TRES CRUCES	\$ 20,656.12	\$ 20,656.12	\$ 20,656.12	\$ 20,656.12	\$ 20,656.12	\$ 20,656.12	\$ 20,656.12	\$ 20,656.12	100	100	680.5	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON COMBINACIÓN DE RECURSOS INTERESES FAISAMUN \$ 20,656.12, INTERESES FORTAMUN \$ 11,024.58, FORTAMUN \$ 939,920.92 TOTAL \$ 971,601.62

FORTAMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/REC AUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
GASTO CORRIENTE	N/A	OPA/2021/03	APORTACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 7,868,884.32	\$ 6,557,403.60	\$ 6,557,403.60	\$ 6,557,403.60	3,934,442.16	3,934,442.16	3,934,442.16	80	80	9	PAGO	ACCIÓN EN PROCESO.
GASTO CORRIENTE	N/A	24001	PAGO DE SUELDOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE Y AGUIBALDO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ACATLÁN PUEBLA, DEL EJERCICIO FISCAL 2024	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 5,058,695.48	\$ 4,058,695.48	\$ 4,058,695.48	\$ 4,058,695.48	2,279,700.91	2,279,700.91	2,279,700.91	56	80	20	PAGO	ACCIÓN EN PROCESO.
GASTO CORRIENTE	N/A	24002	APORTACIÓN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL DE ACATLÁN 2024	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 1,702,882.55	\$ 1,702,882.55	\$ 1,702,882.55	\$ 1,702,882.55	1,702,882.55	1,702,882.55	1,702,882.55	100	100	2	PAGO	ACCIÓN TERMINADA
GASTO CORRIENTE	N/A	24003	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 2024	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 9,285,178.60	\$ 7,485,178.60	\$ 7,485,178.60	\$ 7,485,178.60	3,997,992.00	3,997,992.00	3,997,992.00	80	80	9	PAGO	ACCIÓN EN PROCESO.
GASTO CORRIENTE	N/A	24004	OBLIGACIONES FINANCIERAS: PAGOS DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES (CONAGUA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 97,768.00	\$ 72,204.00	\$ 72,204.00	\$ 72,204.00	24,068.00	24,068.00	24,068.00	75	75	4	PAGO	ACCIÓN EN PROCESO.
GASTO CORRIENTE	N/A	24005	OBLIGACIONES FINANCIERAS: PAGOS DE DESCARGAS (CONAGUA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024 (SOSAPAMA)	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 711,861.00	\$ 711,861.00	\$ 711,861.00	\$ 711,861.00	237,287.00	237,287.00	237,287.00	75	75	2	PAGO	ACCIÓN EN PROCESO.
PUE240202402509	N/A	24021	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE SAN LUIS EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 1,943,873.68	\$ 1,943,873.68	\$ 1,943,873.68	\$ 1,943,873.68	1,000,665.23	1,000,665.23	1,000,665.23	100	100	1,800.00	metros cuadrados	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
PUE240302439887	N/A	24026	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2024	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 606,967.68	\$ 606,967.68	\$ 606,967.68	\$ 606,967.68	606,967.68	606,967.68	606,967.68	100	100	828.00	pieza	ACCIÓN TERMINADA
PUE240302439888	N/A	24029	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA ÁREA VERDE EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA, MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	HERMENEGILDO GALEANA	\$ 521,000.00	\$ 521,000.00	\$ 521,000.00	\$ 521,000.00	521,000.00	521,000.00	521,000.00	100	100	1.00	lote	ACCIÓN TERMINADA
PUE240302439889	N/A	24037	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA PARA EL BARRIO DE SAN GABRIEL EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 475,066.21	\$ 475,066.21	\$ 472,954.64	\$ 472,954.64	472,954.64	472,954.64	472,954.64	100	100	136.00	metros cuadrados	TERMINADO
PUE240302439890	N/A	24038	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE MEDIDORES EN EL MERCADO MUNICIPAL "RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA" EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 592,158.37	\$ 589,932.78	\$ 589,932.78	\$ 589,932.78	589,932.78	589,932.78	589,932.78	100	100	1.00	lote	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
		24041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOPRETO DE CALLE S DE FEBRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+150 EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	LA HUERTA	\$ 392,335.18	\$ 392,335.18	\$ 392,335.18	\$ 392,335.18	392,335.18	392,335.18	392,335.18	100	100	900 m2	M2	OBRA EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA MIDS CON FOLIO No. 339602. OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, CON RECURSOS FAISAMUN \$ 1,545,899.97 TOTAL DE LA OBRA \$ 1,938,235.15, NO SE CAPTURÓ EN LA MIDS POR CIERRE DE PLATAFORMA
PUE240302439892		24050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE PRIVADA VERACRUZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+112 EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	TRES CRUCES	\$ 939,920.92	\$ 939,920.92	\$ 939,920.92	\$ 939,920.92	939,920.92	939,920.92	939,920.92	100	100	680.5	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. OBRA CON RECURSOS FAISAMUN INTERESES \$ 20,656.12, FORTAMUN CAPITAL \$ 939,920.92 INTERESES \$ 11,024.58 TOTAL DE LA OBRA \$ 971,601.62, NO SE CAPTURÓ EN LA MIDS, POR CIERRE DE PLATAFORMA.
PUE240302439892		24050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE PRIVADA VERACRUZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+112 EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	TRES CRUCES	\$ 11,024.58	\$ 11,024.58	\$ 11,024.58	\$ 11,024.58	11,024.58	11,024.58	11,024.58	100	100	680.5	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. OBRA CON RECURSOS FAISAMUN INTERESES \$ 20,656.12, FORTAMUN CAPITAL \$ 939,920.92 INTERESES \$ 11,024.58 TOTAL DE LA OBRA \$ 971,601.62, NO SE CAPTURÓ EN LA MIDS, POR CIERRE DE PLATAFORMA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

SECRETARÍA DE BIENESTAR

Coordinación General de Planeación y Evaluación

11 OCT 2024

14 OCT 2024

RECIBIDO

F. 12 SB CGPSE

000008

REPORTES FINAL EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reaudoado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Acatlán	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	20656.12	0	Total del Programa	Presupuestario	53937073	53957729.12	48564021.82	48564021.82	48564021.82	48564021.82	48564021.82	N/A	48543365.7		Validado	["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Acatlán", "Observación": "MODULO EN PROCESO, NO SE REPORTAN EN DESTINO LAS OBRAS 24006, 24041, 24048 Y 24049, ESTAN EN PROCESO DE REGISTRO EN LA MIDS. LOS INTERESES GENERADOS POR LA SPF SE REGISTRAN EN LA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SALUD Y DEPORTIVA EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Puebla	Acatlán	Partida genérica	2024	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Municipal y de las Demarcaciones	1004	FAISMUN 3 TRIM *	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	19319242.81	12821533.48	12821533.48	12821533.48	12821533.48	12821533.48	12821533.48	N/A	N/A	Validado	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FOVISSTE (APORTACIÓN CON GOBIERNO DEL ESTADO)	
Puebla	Acatlán	Partida genérica	2024	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Municipal y de las Demarcaciones	1004	FAISMUN 3 TRIM *	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	4500000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	N/A	N/A	Validado	PAGO POR LA ELABORACION DE PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS 2024)	
Puebla	Acatlán	Partida genérica	2024	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Municipal y de las Demarcaciones	1004	FAISMUN 3 TRIM *	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	diseño, arquitectura,	1500000	1274963.19	1274963.19	1274963.19	1274963.19	1274963.19	1274963.19	N/A	N/A	Validado	REHABILITACION DE CAMINO	
Puebla	Acatlán	Partida genérica	2024	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Municipal y de las Demarcaciones	1004	FAISMUN 3 TRIM *	Municipio de Acatlán			Inversión	Construcción de caminos, puentes, terrenos y	1000000	1210159.76	1210159.76	1210159.76	1210159.76	1210159.76	1210159.76	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE URBANIZACIÓN PAVIMENTOS DE CALLES EN DIFERENTES LOCALIDADES. EN LA OBRA 24050 SE EJERCIERON LOS INTERESES.	
Puebla	Acatlán	Partida genérica	2024	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Municipal y de las Demarcaciones	1004	FAISMUN 3 TRIM *	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	Construcción de obras para el abastecimiento	18659826.58	22125863.12	19429009.47	19429009.47	19429009.47	19429009.47	19429009.47	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA AGUA, DRENAJE Y ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES LOCALIDADES.	
Puebla	Acatlán	Partida genérica	2024	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Municipal y de las Demarcaciones	1004	FAISMUN 3 TRIM *	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y	8958003.61	11525209.57	8828355.92	8828355.92	8828355.92	8828355.92	8828355.92	N/A	N/A	Validado	["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Acatlán", "Observación": "MODULO EN PROCESO. LOS INTERESES GENERADOS POR LA SPF SE REGISTRAN EN LA PARTIDA 614, EXISTEN PAGOS PENDIENTES DE FINIQUITAR."]	
Puebla	Acatlán	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAM	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	11024.58	0	Total del Programa	Presupuestario	34057651	34068675.58	25554262.8	25554262.8	25554262.8	23564220.49	23564220.49	N/A	25543238.22		Validado	REHABILITACION DEL PARQUE DE SAN LUIS
Puebla	Acatlán	Partida genérica	2024	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAM	1005	N 3 TRIM *	Municipio de Acatlán			Inversión	614 - División de terrenos y	0	2416828.32	2416828.32	2416828.32	2416828.32	2416828.32	2416828.32	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE URBANIZACIÓN PAVIMENTOS DE CALLES EN DIFERENTES LOCALIDADES. EN LA OBRA 24050 SE EJERCIERON LOS INTERESES.	
Puebla	Acatlán	Partida genérica	2024	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAM	1005	N 3 TRIM *	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	271 - Vestuario y uniformes	522553	2887459.4	1343280.68	1343280.68	1343280.68	1343280.68	1343280.68	N/A	N/A	Validado	PARTIDA CANCELADA	
Puebla	Acatlán	Partida genérica	2024	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAM	1005	N 3 TRIM *	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	311 - Energía eléctrica	450000	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	Validado	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 2024.	
Puebla	Acatlán	Partida genérica	2024	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAM	1005	N 3 TRIM *	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	313 - Agua	13000000	9285178.6	7207187.35	7207187.35	7207187.35	6341717	6341717	N/A	N/A	Validado	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2024	
Puebla	Acatlán	Partida genérica	2024	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAM	1005	N 3 TRIM *	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	313 - Agua	739735	809629	562284	562284	562284	562284	562284	N/A	N/A	Validado	OBLIGACIONES FINANCIERAS: PAGOS DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS (CONAGUA) 2024	
Puebla	Acatlán	Partida genérica	2024	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAM	1005	N 3 TRIM *	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	9571766.87	9571766.87	2260286.15	8260286.15	8260286.15	7604545.79	7604545.79	N/A	N/A	Validado	APORTACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 2024 Y CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ACATLÁN 2024.	
Puebla	Acatlán	Partida genérica	2024	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAM	1005	N 3 TRIM *	Municipio de Acatlán			Inversión	comunicación y	1501000	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	Validado	PARTIDA CANCELADA	
Puebla	Acatlán	Partida genérica	2024	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAM	1005	N 3 TRIM *	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	5198596.13	5198596.13	4046495.84	4046495.84	4046495.84	3577664.24	3577664.24	N/A	N/A	Validado	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2024 DE ACATLAN PUEBLA	
Puebla	Acatlán	Partida genérica	2024	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAM	1005	N 3 TRIM *	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de vídeo	0	1501000	0	0	0	0	0	N/A	N/A	Validado	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN, DEL EJERCICIO FISCAL 2024	
Puebla	Acatlán	Partida genérica	2024	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAM	1005	N 3 TRIM *	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0	680316.8	0	0	0	0	0	N/A	N/A	Validado	ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2024	
Puebla	Acatlán	Partida genérica	2024	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAM	1005	N 3 TRIM *	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	2574000	589932.78	589932.78	589932.78	589932.78	589932.78	589932.78	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD PUBLICA 2024 Y EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO.	
Puebla	Acatlán	Partida genérica	2024	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAM	1005	N 3 TRIM *	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	581 - Terrenos	500000	521000	521000	521000	521000	521000	521000	N/A	N/A	Validado	ADQUISICIÓN DE TERRENO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA, MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	



[illegible]

[illegible]

REPORTE FINAL INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2024

Reporte Final Indicadores Tercer Trimestre 2024																											
Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2024	3	Puebla	Acatlán	33 - Aportación 420 - Dirección 1005	FORTAMUN	6 - Fondo de Aportación	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos		(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial) / Monto anual aprobado del FORTAMUN al (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66666		66.66666		69.18921		META ALCANZADA. EXISTEN PAGOS PENDIENTES DE FINIQUITAR.	103.78	Validado		
2024	3	Puebla	Acatlán	33 - Aportación 420 - Dirección 1004	FAIS Municipi	5 - Fondo de Aportación	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS		(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	38.09524		38.09524		63.88889		LAS OBRAS 24006, 24048 Y 24049, NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE RECURSO TRANSFERIDO	167.71	Validado		
2024	3	Puebla	Acatlán	33 - Aportación 420 - Dirección 1005	FORTAMUN	6 - Fondo de Aportación	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México		(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66666		66.66666		75		LA OBRA 24041, NO SE REPORTA EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTA EN PROCESO DE CAPTURA META ALCANZADA.	112.5	Validado		
2024	3	Puebla	Acatlán	33 - Aportación 420 - Dirección 1004	FAIS Municipi	5 - Fondo de Aportación	191070	MIDS		(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	57.14286		57.14286		33.33333		EN PROCESO DE CAPTURA META ALCANZADA.	171.43	Validado		
2024	3	Puebla	Acatlán	33 - Aportación 420 - Dirección 1004	FAIS Municipi	5 - Fondo de Aportación	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS		(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	4.7619		4.7619		2.77778			171.43	Validado		

SECRETARÍA de Bienestar Gobierno de Puebla
OPERADO
